

특수공시 사업 목록

(2015. 12. 31.기준 / 단위 : 억원)

분 야 별	사 업 명	총사업비	공정율
일반공공행정	○ 신안 공설운동장 조성	177	80%
	○ 자은 구영 재해위험지구 정비사업	121	10%
	○ 홍도2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	30	5%
문 화 및 관 광	○ 하의 해양테마파크 조성	86	90%
	○ 임자 만구읍관 복원 조성	48	80%
	○ 예술의 섬 조성	92	60%
환 경 보 호	○ 임자 전장지구 농어촌마을 하수도정비사업	84	50%
	○ 비금.도초 면단위 하수처리장 설치사업	164	15%
	○ 압해 하수종말처리시설 공사	234	85%
농림해양수산	○ 자은 두모 소하천 정비사업	29	30%
국 토 및 지 역 개 발	○ 안좌 ~ 자라간 연도교 가설공사	466	53%

1 신안 공설운동장 조성

목 적

- 신안군민의 건전한 여가활동 및 체력 향상을 지원하고 각종 행사를 통한 군민 화합은 물론 각종 체육경기 및 문화행사 개최

■ 사업 개요

- 사업명 : 신안 공설운동장 조성사업
- 사업량 : 관람석5,000석, 인조구장, 트랙, 주차장(304대)
- 총사업비 : 17,700백만원(국비 3,450, 군비14,250)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2016년

■ 추진현황 및 계획

- 투융자심사완료 : '05. 12.
- 부지매입완료 : '10. 5.
- 지방건설기술심의완료 : '11. 2.
- 문화재 지표조사완료 : '11. 3.
- 실시계획승인 : '11. 5.
- 조달청 공사원가 사전심의 완료 : '11. 6.
- 현재 문화재시굴조사 실시 : '11. 8.
- 문화재시굴조사 ⇒ 발굴조사 전환 : '12. 3.
- 공사계약 및 착공 : '13. 6.
- 공사 준공 : '16. 6.

■ 기대 효과

- 전문 체육인프라 시설을 집약적으로 구축하여 각종 체육대회 유치

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2013년이전	2014년	2015년	2016년이후
사업비	17,700	7,825	5,370	2,433	2,072

조 감 도



2 자은 구영 재해위험지구 정비사업

목 적

- 근본적인 침수해소 대책을 수립하여 저지대 침수예방과 주민생활 안정 도모
- 침수 해소를 통한 지역주민의 소중한 인명과 재산보호

■ 사업 개요

- 지 구 수 : 자은면 구영리 일원
- 사 업 량 : 우수관로 L=2,297m, 배수로 L=2,360m, 교량 4개소, 가동보 2개소
- 총 사 업 비 : 12,085천원
- 사 업 기 간 : 2016. 05. 10 ~ 2018. 01. 05(20개월)

■ 추진현황 및 계획

- 2016. 05. 19 : 계약 및 착공
- 2016. 10. 30 : 보상 완료 및 부대공사 추진
- 2017. 12. 31 : 공사완료 예정

■ 기대 효과

- 배수체계의 근본적인 문제 해결로 인한 침수예방 및 정주여건 개선
- 침수피해로 인한 지역민의 소중한 인명과 재산보호

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2012년이전	2013년	2014년	2015년이후
사업비	12,085	-	-	-	12,085

위치도



전경사진



3 홍도2 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

목 적

- 연간 30만명의 관광객과 530여명 주민의 인명 및 재산피해 사전예방
- 관광지 내 위험요소 정비로 관광객 유치 활성화

■ 사업 개요

- 지 구 수 : 흑산면 홍도리 산20-1번지
- 사 업 량 : 사면정비 L= 70m, A= 840㎡
- 총 사 업 비 : 3,000백만원
- 사 업 기 간 : 2016. 10 ~ 2017. 12

■ 추진현황 및 계획

- 2015. 11. 03 : 실시설계 용역 착수
- 2016. 05. 11 : 문화재청 현상변경 협의
- 2016. 10. 30 : 사업 착수 예정
- 2017. 12. 31 : 사업 완료 예정

■ 기대 효과

- 사면정비를 통한 대규모 인명피해 예방
- 불안요소 정비를 통한 정주여건 개선

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2012년이전	2013년	2014년	2015년이후
사업비	3,000	-	-	-	3,000

 위치도



 전경사진



4 하의 해양테마파크 조성

목 적

- 김대중 전 대통령의 업적을 기리고, 관광객과 지역주민의 휴식 및 문화체험 공간 확보로 지역경제 활성화에 기여

■ 사업 개요

- 위 치 : 신안군 하의면 후광리 일원
- 사업 량 : 유스호스텔, 전시관, 노벨미로공원, 기념탑 등
- 총 사업 비 : 8,570백만원('15년 사업비 : 882백만원)
- 사업 기 간 : 2010년 ~ 2016년

■ 추진현황 및 계획

- '08년 7월 : 기본계획 완료
- '12년 2월 : 실시설계 완료
- '13년 2월 : 사업 계약 및 착공
- '16년 12월 : 사업 완료예정

■ 기대 효과

- 관광객과 지역주민의 휴식공간 확보는 물론 관광자원으로 활용하여 지역브랜드 제고로 지역주민 소득증대에 기여

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2013년이전	2014년	2015년	2016년이후
사업비	8,570	3,875	3,333	882	490

조 감 도



5 임자 만구음관 복원 조성

목 적

- 조희룡 선생의 유배생활 흔적을 복원하여 후손들의 문화탐방, 체험학습장으로 활용하고 지역경제 활성화에 기여

■ 사업 개요

- 위 치 : 신안군 임자면 이흑암리 일원
- 사업 량 : 적거지복원, 돌담복원, 야외상징물 등
- 총 사업 비 : 4,800백만원
- 사업 기 간 : 2011년 ~ 2017년

■ 추진현황 및 계획

- '10년 11월 : 기본계획 완료
- '12년 11월 : 실시설계 완료
- '13년 3월 : 사업 계약 및 착공
- '16년 2월 : 조희룡기념관 준공
- '16년 5월 : 편의시설 조성공사 설계용역 계약
- '17년 6월 : 사업 준공예정

■ 기대 효과

- 조희룡 선생에 대한 새로운 조명으로 다양한 문화 체험장으로 활용하고, 주변 관광과 연계하는 관광 상품 제공

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2013년이전	2014년	2015년	2016년이후
사업비	4,800	2,833	750	0	1,217

조성계획도



조희룡기념관 조감도



6 예술의 섬 조성

목 적

- 한국을 대표하는 서양화가 김환기 화백의 고향인 안좌도를 문화예술의 고장으로 조성하여 지역 이미지 제고 및 다양한 콘텐츠 개발을 통한 지역경제 활성화에 기여

■ 사업 개요

- 위 치 : 신안군 안좌면 일원
- 사업비 : 9,200백만원 (광특 5,400 도비 200 군비 3,600)
- 사업기간 : 2011 ~ 2017
- 사업내용 : 예술창작공방 리모델링, 지역문화 콘텐츠, 역사의 시간, 상징 조형물 등

■ 추진현황 및 계획

- 2011. 05 : 기본계획 용역 완료
- 2011. 10 ; 투융자심사 완료
- 2012. 12 : 실시설계 용역 완료
- 2013. 05 : 시설사업(건축 · 토목 · 조경)1차분 착공
- 2014. 12 : 시설공사(창작공방 및 테마공원) 준공
- 2015. 05 : 고대화석 및 광물 등 전시시설 준공
- 2015. 10 : 테마공원 예술조형물 설치 완료
- 2016. 06 : 예술의 섬 조성사업(2단계) 건축공사 착공
- 2016. 12 : 예술의 섬 조성사업(2단계) 건축공사 준공 예정


■ 기대 효과

- 문화 예술을 대표하는 고장으로 위상 강화 및 새로운 명소로서 가치증진과 수용확대를 통한 관광자원으로 활용

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2013년이전	2014년	2015년	2016년이후
사업비	9,200	3,333	3,533	1,057	1,277

테마별 위치도

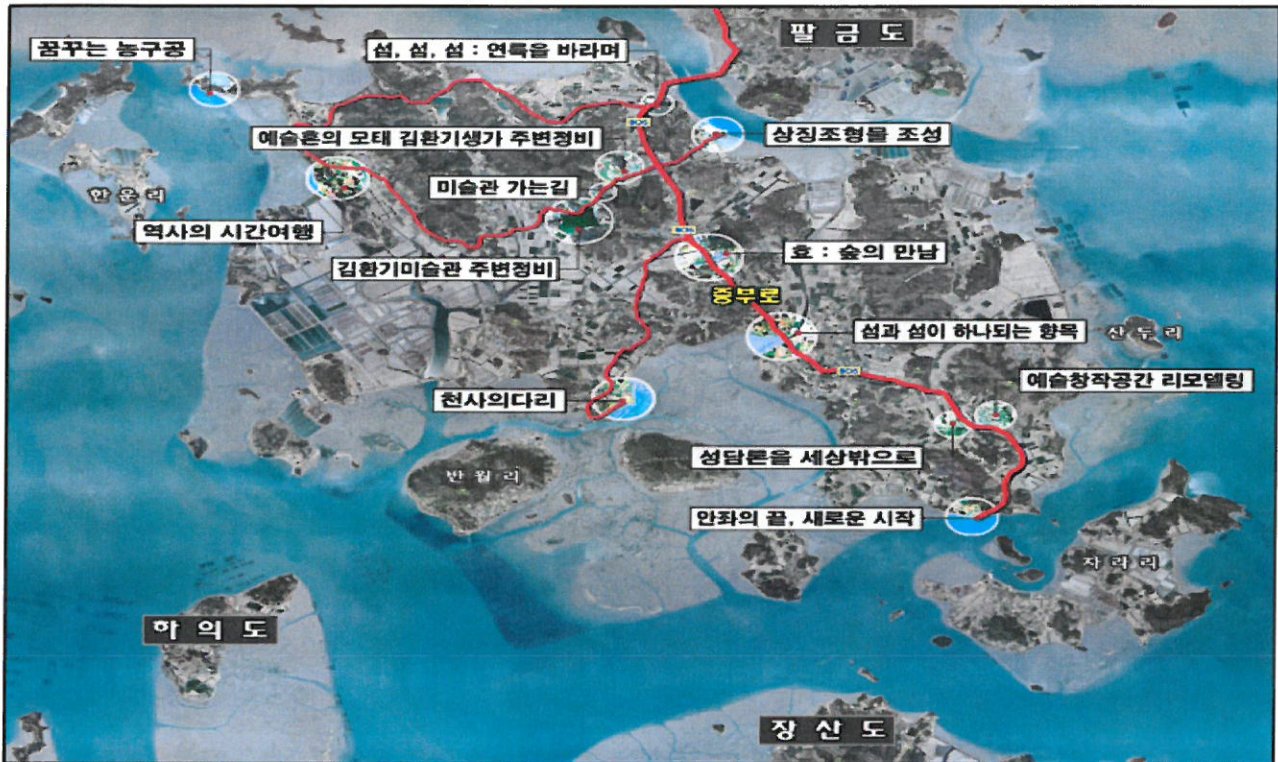

방월 고인돌	김환기 생가	안창초등학교

7 임자 전장지구 농어촌마을 하수도정비사업

목 적

- 임자면 전장지구에서 배출되는 생활오·폐수를 정화하여 수질오염방지 및 생활환경 개선을 도모

■ 사업 개요

- 위 치 : 임자면 도찬리 일원
- 사업량 : 소규모공공하수처리시설 1개소($Q=100\text{m}^3/\text{일}$),
오수관거 신설 $L=4.96\text{km}$, 오수중계펌프장 3개소
- 사업비 : 83.69억원 (국비:지방비=7:3)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

■ 추진현황 및 계획


- 실시설계 용역 착수 2013. 02
- 공법심의위원회 개최 및 공법선정 2013. 09
- 실시설계 완료 2013. 12
- 재원협의의견 조치결과제출 및 협의완료 2014. 04
- 전라남도 설계자문 완료 2014. 05
- 도로점용 등 각종 인허가 완료 2014. 06
- 공사착공 2014. 12

■ 기대 효과

- 보건위생 효과 : 하천의 오염으로 인한 수인성 전염병의 발병을 저감 효과
- 수도생산비 절감효과 : 하천의 수질을 향상시킴으로써 수도생산비용 절감 효과

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2013년 이전	2014년	2015년	2016년 이후
사업비	8,369	1,143	3,033	2,097	2,096

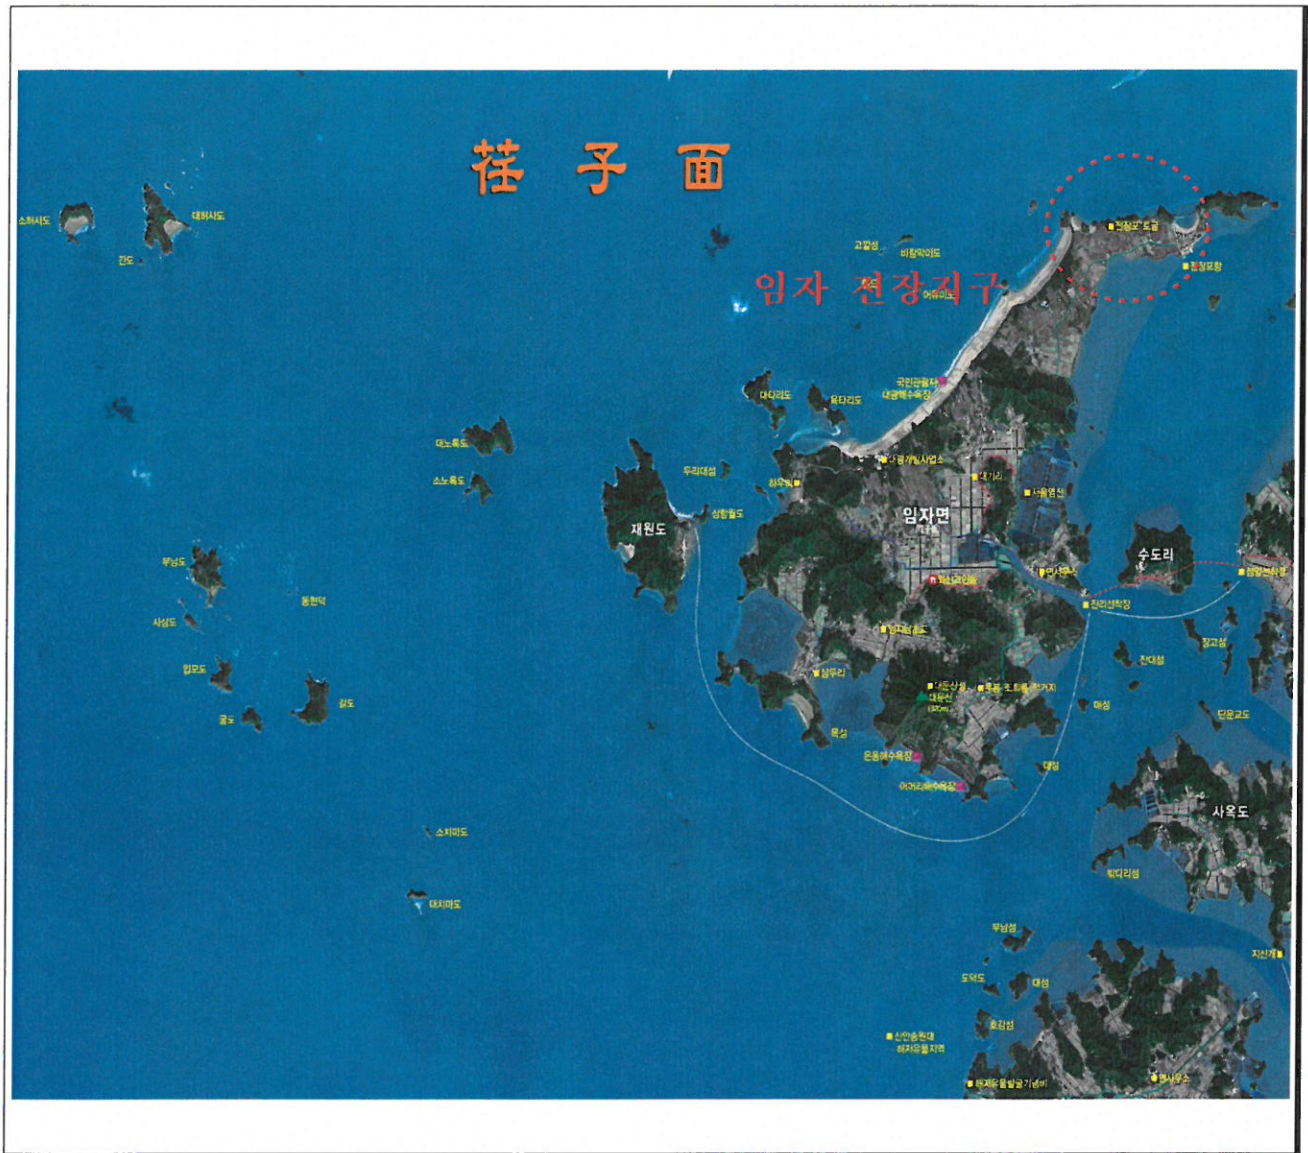

8 비금·도초 면단위 하수처리장 설치사업

목 적

- 비금면 도고2지구, 도초면 나포지구에서 배출되는 생활 오·폐수 정화
- 수질오염방지 및 생활환경 개선을 도모

■ 사업 개요

- 위 치 : 비금면 지당리, 도초면 외남리 일원
- 사업량 : 처리장 - 비금 150m³/일, 도초 65m³/일
오수관로 - 비금 13.87km, 도초 4.78km
- 사업비 : 164억원 (국비:지방비=7:3)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

■ 추진현황 및 계획

- 실시설계 용역 착수 2013. 02
- 기초자료 수집 및 분석 2013. 03
- 공법선정 완료(공법선정위원회) 2013. 09
- 실시설계 완료 2013. 11
- 설계 VE 완료 2014. 03
- 재원협의(영산강유역환경청) 완료 2014. 05
- 설계자문(전남도청) 완료 2014. 07
- 공사착공 2015. 02

■ 기대 효과

- 신안군 비금면 도고2지구, 도초면 나포지구 일원에서 발생하는 오수를 수질 기준에 적합하게 처리함으로써 입주민의 공중보건위생향상 및 생활환경개선을 도모하고 방류수역의 수질 및 생태계를 보존

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2013년이전	2014년	2015년	2016년이후
사업비	16,425	-	428	5,399	10,598

위치도



9 압해 하수종말처리시설 공사

목 적

- 압해읍에서 발생하는 생활하수를 정화하여 방류함으로 수질환경 보존
- 수질환경 보존을 통한 주민의 보건위생 확보 및 정주여건 개선

■ 사업 개요

- 사업 위치 : 압해읍 일원
- 사업 량
 - 하수처리시설 : 처리용량 2,200㎥/일, 오수관로 13.7km
 - 하수관거정비 : 오수관로 37.5km, 배수설비 40.5km(1,045가구)
- 총 사업비 : 431억원 (처리장 23,371 관거정비 19,839)
- 사업 기간 : 2005년 ~ 2015년
- 하수처리대상 : 1,045가구, 4,820명(보급율 31.8% ⇒ 42.4%)

■ 추진현황 및 계획

- 2012.01 : 하수처리시설공사 착공
- 2012.11 : 하수관거정비공사 착공
- 2016.03 ~ 2016.05 : 하수종말처리시설 시운전
- 2016.11 : 공공하수처리시설 사용개시

■ 기대 효과

- 생활하수의 체계적 관리로 방류수역 수질환경 개선
- 지역민의 주거환경 개선 및 정주여건 향상

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2013년 이전	2014년	2015년	2016년 이후
사업비	23,371	12,428	7,312	3,630	



10 자은 두모 소하천 정비사업

목 적

- 태풍내습 및 집중호우 시 농경지 침수예방을 통한 영농소득 증대
- 침수 해소를 통한 지역주민의 소중한 인명과 재산보호

■ 사업 개요

- 지 구 수 : 자은면 송산리 두모천
- 사 업 량 : 호안공 A= 10,066㎡, 암거 2조, 개거 L= 1,023m
- 총 사 업 비 : 2,880백만원
- 사 업 기 간 : 2015.01.02 ~ 2017.06.30

■ 추진현황 및 계획

- 2015. 01. 02 : 사업(총괄분) 착수
- 2016. 04. 07 : 1차분 준공
- 2016. 04. 29 : 3차분 착수
- 2017. 06. 30 : 사업 완료 예정

■ 기대 효과

- 소하천 정비를 통한 배수 원활 및 영농소득 증대 기여
- 침수피해로 인한 지역민의 소중한 인명과 재산보호

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2012년이전	2013년	2014년	2015년이후
사업비	2,880	-	-	406	2,474

 위치도



 전경사진



11 안좌~자라간 연도교 가설공사

목 적

- 지방도 805호선 미개통 구간의 연도교 개설사업
- 도서지역 접근성 향상 및 지역경제 활성화

■ 사 업 개 요

- 사 업 위 치 : 신안군 안좌면 자리리 ~ 복호리 일원
- 사 업 량
 - 총연장 : 2,003km (해상교량 : 670m, 접속도로 : 1,333m)
 - 왕복2차로, 설계속도 : 60km/hr
- 총 사 업 비 : 466억원 (국비 326억원, 도비 70억원, 군비 70억원)
- 사 업 기 간 : 2011년 12월 ~ 2018년 4월

■ 추진현황 및 계획

- 2011.05 : 실시설계 입찰자 선정
- 2011.09 : 실시설계 완료
- 2011.12 : 공사계약 및 착공
- 2018.04 : 공사준공 예정

■ 기 대 효 과

- 다이아몬드제도 개발과 연계한 교량의 관광 상품화
- 도서지역 가치향상을 통한 균형발전 유도

■ 연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2013년이전	2014년	2015년	2016년이후
사업비	46,600	20,063	3,000	7,000	16,537

위치도 및 계획평면도



 조감도

